

柳溪村：四条路，只能先走通一条

柳溪村驻村工作队 · 2024 年度项目进展汇报

这份汇报请镇里和我们一起回答三个问题

01

柳溪村到底难在哪?

难的不是某一件事，是四件事锁成了一个环。

02

四条产业路线，用什么尺子比?

投入、带动户数、周期、风险、可持续，一把尺子量到底。

03

第一笔钱和第一块地，押给谁?

要有量化理由，不是“都很重要”。

柳溪村的基本盘

地处北方丘陵，距镇政府 14 公里，最近高铁站 62 公里



1 043 人 / **386** 户

户籍人口

412 人

常住人口，占户籍 39.5%

2 140 亩

耕地总面积，户均 5.5 亩

4.8 万元

2023 年村集体经营性收入

14 800 元

2023 年村民人均可支配收入

村级数据为驻村工作队台账示例值，上会前按最新台账核定；页面影像为情境影像，非本村实拍。

人：留下的人
平均 61 岁


386 户里，487 人在外务工，80% 在省外

61 岁

常住 412 人的平均年龄

户籍 1 043 人，常住为户籍的 39.5%

柳溪村常住人口 412 人 · 年龄结构（人）

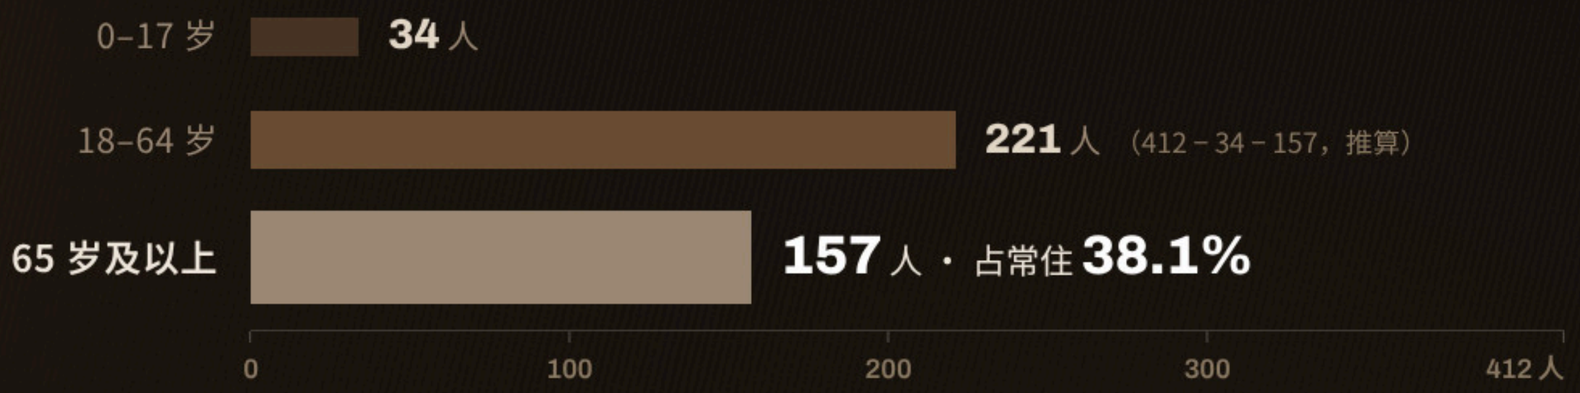

另一把尺子 · 全国参照（百分比刻度，与上方人数轴无关）



65 岁及以上人口占比：全国乡村 **17.72%**，比城镇高 **6.61** 个百分点（第七次全国人口普查，2020 年）；柳溪村常住 **38.1%**，约为全国乡村水平的 2 倍。

本村 · 在外务工

487 人在外务工，约 **80%** 在省外

另一组全国数字 · 农民工口径（与本村常住人口口径不同，不作并列比较）

全国外出农民工 **1.8** 亿人

50 岁以上农民工占 **32.0%**，2021 年为 **27.3%**，五年升 **4.7** 个百分点

全国**本地**农民工平均 **46.8** 岁、外出农民工 **39.3** 岁——农民工口径，不等于村庄常住人口平均年龄

本村数值为工作队台账示例值；全国数值来自七普（2020 年）与国家统计局《2025 年农民工监测调查报告》。



420


亩常年撂荒

占耕地 19.6%，主要是坡地、远地、没水的地

现状 · 加压二　地

2 140 亩
分成了 1 832 块

平均单块 **1.17** 亩，户均耕地 **5.5** 亩；地不是一整片，是一地碎片。

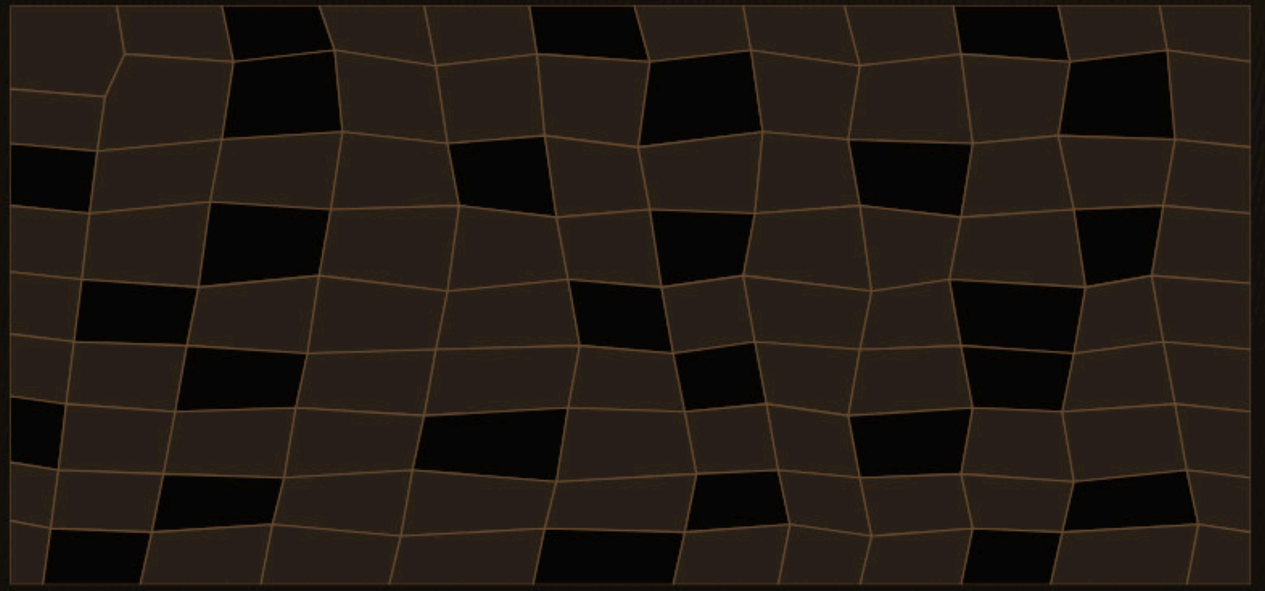

在耕地块　撂荒地块（约五分之一）

示意图，不按实际地块测绘

全国参照：小农户 **户均经营规模 7.8 亩**，小农户占农业经营主体 98% 以上、占耕地面积 70%（第三次全国农业普查，2016年）。本村户均 5.5 亩，低于全国户均水平；1 832 块为工作队台账数，全国无户均地块数权威统计，不作并列对比。

钱：村集体一年挣不出一台农机

2023 年村集体经营性收入 4.8 万元，另有历史负债 11 万元

2023 年村集体经营性收入

4.8 万元

机动地发包 3.2 万 ＋ 光伏分红 1.6 万



集体一年的全部收入，买不起一台拖拉机，刚够搭一座棚。


村集体收支为工作队台账示例值；设备与大棚造价为行业通行区间

三年四个项目，为什么都停在第二年

2021–2023 年柳溪村产业项目台账

三年累计投入

166 万元

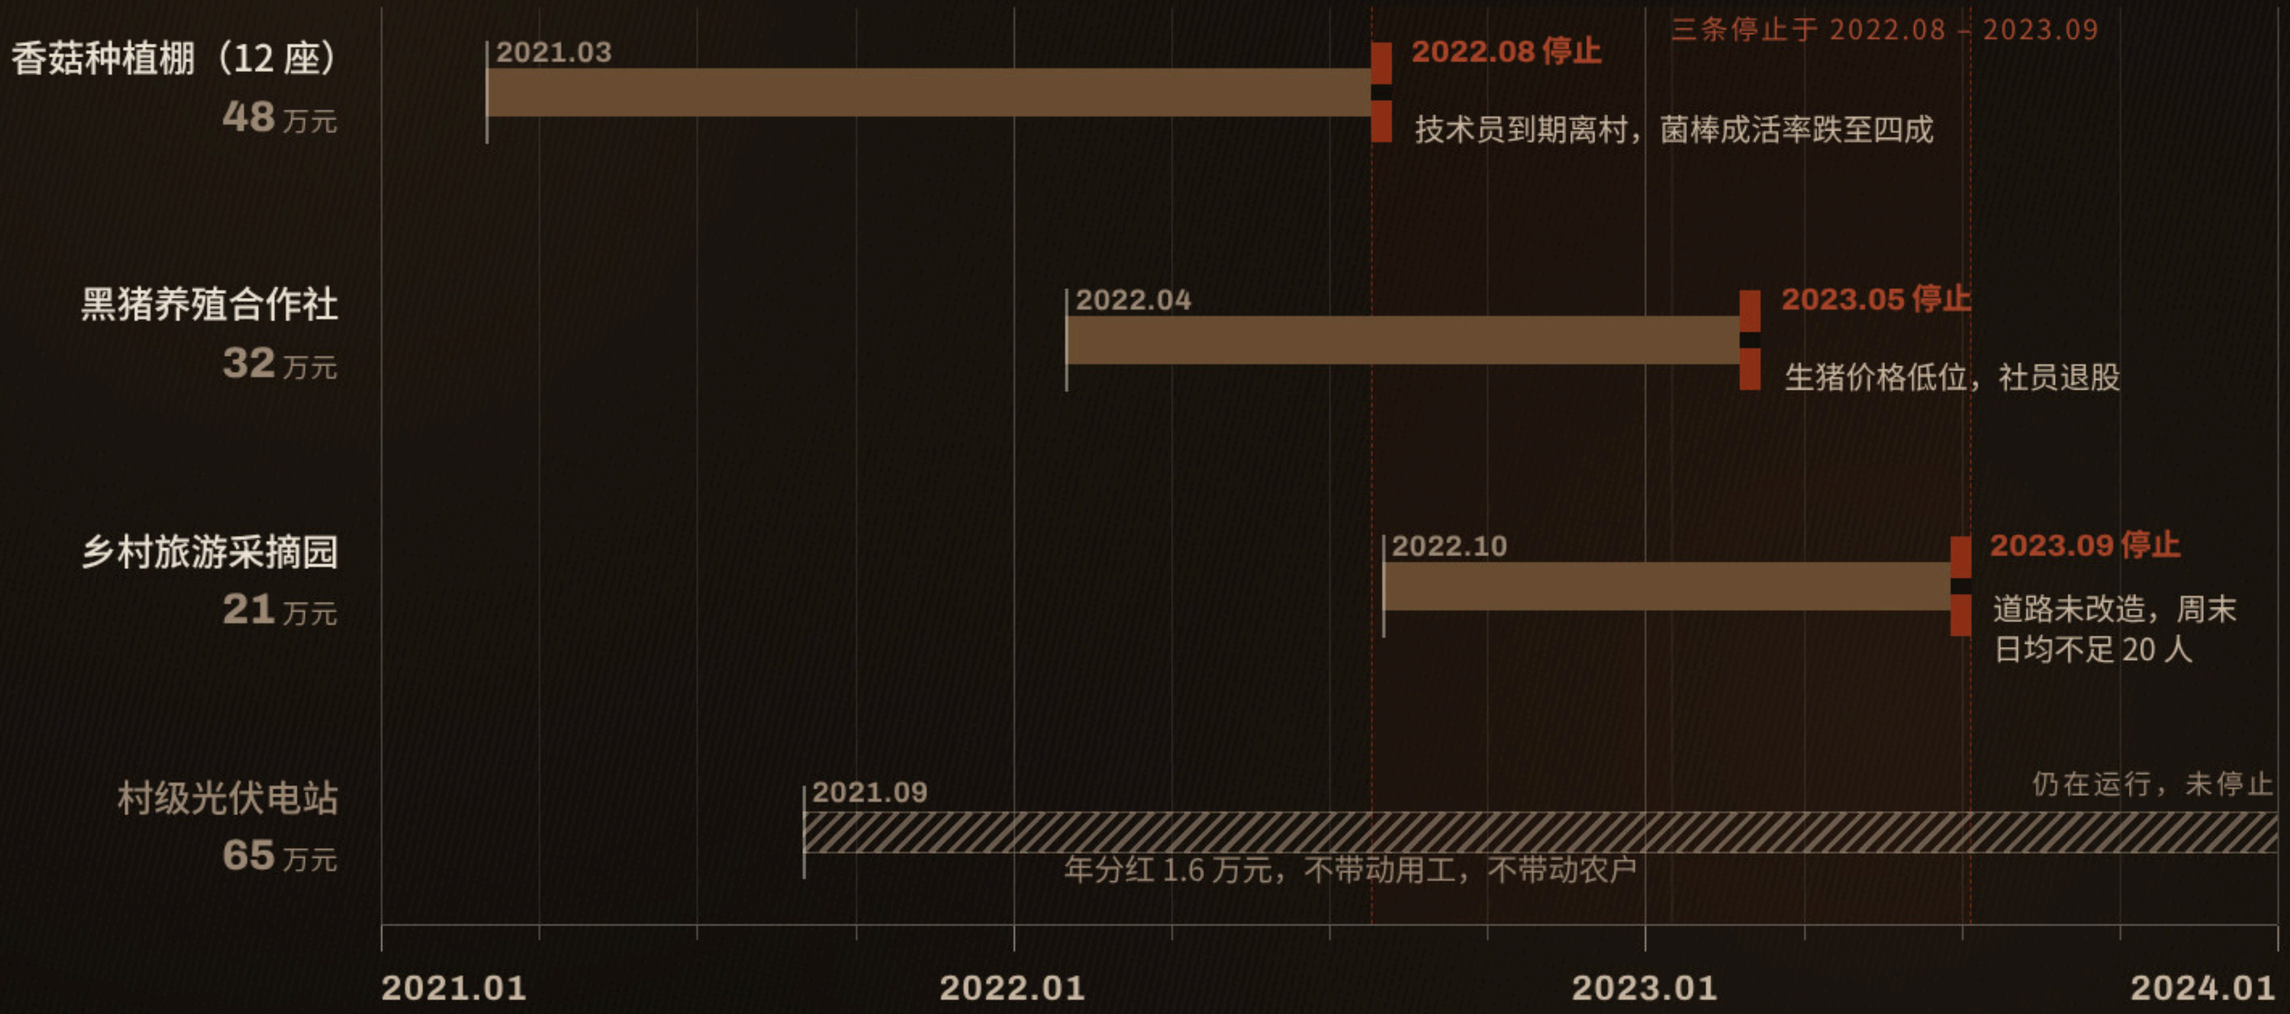

刻度为月，小刻度每 3 个月；项目数据为工作队台账示例值

困住柳溪的不是一个问题，是一个闭环

01

集体无经营性收入

4.8 万元 / 年（2023）

因此

02

无法自筹配套资金
与后期运维费用

0 元可自筹 · 另负债 11 万元

因此

放大因素 · 土地

1 832 块碎地，撂荒 **420** 亩

放大「自筹困难、周期拉长」

03

只能依赖一次性
帮扶资金立项

166 万元全部来自外部帮扶

投入在这里被吸收

因此

04

资金停、技术人停、项目停

4 个项目，三年，全部停在第二年

放大因素 · 劳动力

常住 **412** 人，平均 **61** 岁

放大「无人接手」

回到起点

所以问题不是「再投一个项目」，
而是必须有一条路线能自己把环打断。

4.8 万元

这是柳溪村一年能自己支配的全部

所以不能
四条路一起走

我们换了方法：一把尺子，五个维度

先定尺子，再量路线——不是先选好路线再找理由

每维评分刻度

1 分 — 5 分最优

带动户数 越多越好	**30%**	首年能直接获得土地流转租金、务工收入或订单收购收入的本村农户数
周期 越短越好	**25%**	从资金到位到首次产生现金流的时间 带动户数 + 周期 = 55%，这两项是决定性的
风险 越低越好	**20%**	价格波动、需求波动、合规门槛、对特定经营者的依赖的综合暴露程度
可持续 越强越好	**15%**	补贴退出三年后仍能自我维持并继续付薪／分红的能力
投入 越低越好	**10%**	本村条件下的启动总投资（含设施、设备、首期流动资金）

权重依据

决策目标是“在集体零自有资金、劳动力老龄化条件下，尽快形成可持续的联农带农收入”，因此带动户数与周期置于首位；**投入权重最低，不是因为钱不重要，而是因为四条路线的启动资金都要靠外部争取，投入高低不是本村可控变量。**

打分为评估判断，不是测量值；每维 1–5 分、5 分最优，分值依据行业参考数据区间与本村条件对照给出。权重由驻村工作队与村两委共同设定，第 17 页附权重敏感性检验。



路线一 / 四

设施果蔬

唯一同时提供「租金＋薪金」两条联结通道的路线

五维读数　刻度 1–5



3.6 万元　北方地区每亩蔬菜日光温室年均纯收入；对照三种粮食作物 2022 年亩均净利润 **189.3** 元（年份与口径不同，仅作量级示意）

30 人　每 100 亩设施大棚约带动务工人数，另有流转户获租金

补贴随连片规模分档：日光温室 10 亩以上 **1.2** 万元/亩 → 50 亩以上 **2.5** 万元/亩，连片规模直接决定补贴档位

设施农业用地可使用一般耕地、**不需办理建设用地审批手续**、不需落实耕地占补平衡

来源：农业农村部种植业管理司；《全国农产品成本收益资料汇编》；辽宁喀左县 2023 年设施农业补贴方案；自然资源部、农业农村部设施农业用地通知

路线二 / 四

乡村民宿

单位投入最重、回收期最长，
但带动关联就业的倍数最高



36%

全国民宿平均入住率

367元

平均房价，同比降约 30%

2025 年 10 月，据行业报告（原始为平台数据），非官方统计；单房收益 132 元/间夜

国家发改委网站刊发调研：**64.55%** 的民宿全年平均入住率低于 40%；**82.24%** 单房年营收不足 10 万元

2025 年新注册 8.7 万家，同期注销吊销 **2.9 万家**

投入：农房轻改一院 30–50 万元，精品约 69 万元/间。回收期轻改 3–4 年、中端 5 年以上、品牌 6–8 年（据 2015–2019 年资料，与上列 2025 年经营数据不在同一周期，不可混算）

合规五项硬约束：消防、治安实名登记、建筑安全、卫生、用地（文旅市场发〔2022〕77 号）

大理关联就业倍数 1:6（依赖成熟旅游目的地属性，本村无景区依托，不可照搬）

五维读数　刻度 1–5

带动户数	3
周期	1
风险	1
可持续	4
投入	2

来源：国家发改委网站刊发调研（2026）；文旅部等十部门文旅市场发〔2022〕77 号；行业报告（2025）；云南日报



路线三 / 四

农村电商

门槛最低的一条，也是最不能独立成立的一条

增速换挡　农村网络零售额



农产品网络零售额增速同期 12.5% → 15.8% → **9.9%**。商务大数据口径，与统计局社零口径不是同一套数据，不可相加换算。

退货率对比　共享刻度 0–40%



退货率为直播电商**全品类**口径，不可直接套用于农产品。我国果蔬冷链运输率仅约 **35%**，生鲜退货的货值与运费同时损失。

五维读数　刻度 1–5



村级服务点硬件投入以千元—万元计，无需新增土地与基建

中央财政资金**不得用于购买流量、不得用于人员经费**——流量费与人工须靠销售毛利覆盖

政策已明确「从重建设向重运营转变」；官方定位为渠道与抓手，非独立产业

来源：商务部流通发展司（2024、2026）；行业监测与学术综述转引；财建〔2019〕50 号相关规定

路线四 / 四

农产品初加工

政策周期最长的一条，但要先有稳定的原料

产地产后损失率　项目区口径

22.7% → **7.1%**

实施前　　实施后

本来会烂掉的农产品被救回来——这是加工路线最可核查的收益逻辑。

补贴「双限」：不超过总造价 **30%**（脱贫县不高于 40%），单个主体封顶 **100 万元**；「先建后补」意味着村集体须先全额垫资

由上述补贴规则反推，单体总造价约 **250 万–333 万元**（推算值，非报价）

冷链烘干专项方案支持周期排至 **2030 年**（累计 6 万座仓储保鲜设施）

原料季节性决定开工率；SC 认证是阶段性门槛；退出成本最高

五维读数　刻度 1–5

带动户数	3
周期	3
风险	2
可持续	5
投入	2

加工业与农业总产值比

2.3:1　2018

2.65:1　2024

3:1　2030 目标

发达国家一般在 **3–4:1**。与上方损失率口径不同，两组数据不可合并解读。



来源：农业农村部、财政部产地冷藏保鲜设施建设通知（2023）；国家发展改革委；冷链物流和烘干设施建设专项实施方案


天亮的方向，
是算出来的
五个维度，四条路线，二十个读数

四条路线 × 五个维度

每维 1–5 分，5 分最优 —— 权重：带动户数 **30** / 周期 **25** / 风险 **20** / 可持续 **15** / 投入 **10**

设施果蔬 4.00 分

领先第二名 1.00 分

	设施果蔬	乡村民宿	农村电商	农产品初加工
投入 10%	3	2	5	2
带动户数 30%	5	3	3	3
周期 25%	4	1	3	3
风险 20%	3	1	2	2
可持续 15%	4	4	2	5
加权总分	**4.00**	**2.15**	**2.85**	**3.00**

色阶 1 2 3 4 5 越亮越金＝分值越高

形状指纹　同轴 · 同刻度



设施果蔬 4.00



乡村民宿 2.15



农村电商 2.85




农产品初加工 3.00

分值由行业参考数据区间与本村条件对照给出，每格依据可查；打分为评估判断，非测量值。权重由驻村工作队与村两委共同设定，下一页附权重敏感性检验。

为什么押设施果蔬

三条量化理由，每一条都可以当场验算

01 差距不是误差范围

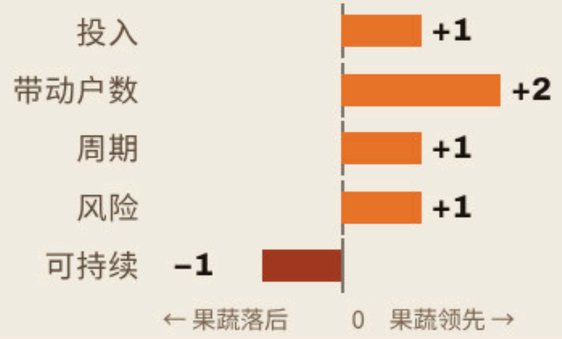

0.10×1 + 0.30×2 + 0.25×1 + 0.20×1 − 0.15×1 = 1.00

设施果蔬 4.00 分，第二名农产品初加工 3.00 分；5 分制下相当于 25% 的差距。算式即上方五维差值按工作队权重加总。


02 带动效率最高

85 户　**22%**　首年直接受益农户占全村 386 户

一期 120 亩：连片流转涉及约 **70 户**，务工岗位约 **36 人**（常年 4–6 人＋季节性 30 余人），扣除重叠后约 85 户。四条路线中唯一首年即覆盖全村五分之一以上农户的一条。

03 换一套权重，结论不变

四个方案共享同一纵向刻度（加权总分 0–5），为离散方案并置，非连续变化

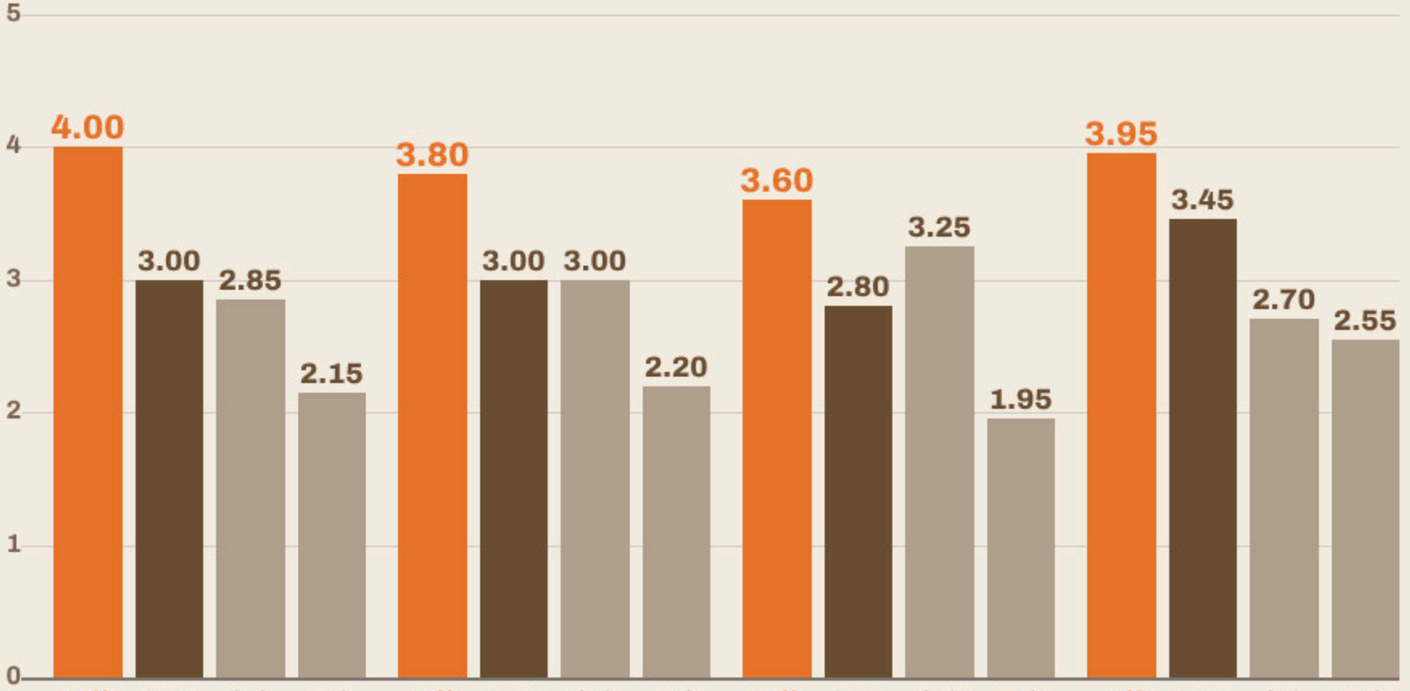

57%　保持其余四维相对比例不变，只有当「可持续」单维权重提高到**约 57% 以上**时，加工才可能反超——已不在本次决策的合理权重区间内。**四种权重方案下，设施果蔬都是第一。**

打分为评估判断，非测量值；带动户数为测算值，非承诺；敏感性检验基于同一组评分。

另外三条路不是砍掉，是各归其位

一条主线
一条配套
一条二期
一条暂缓

暂缓不是否定。
四条路线共用同一把尺子，
条件变化就重新打分。

现在就干

主线 – 设施果蔬

加权 **4.00** 分，四种权重方案下均为第一；首年带动约 **85** 户。**动作见下一页 18 个月路径。**

与主线同步
不独立立项

配套 – 农村电商

电商不是第五个产业，是前面那条路做成了的乘数。

官方定位为渠道与抓手而非独立产业；财政不补流量与人工，无自有货源即无毛利。投入最轻（硬件以千元—万元计），依托既有村级服务点。

触发 首季产出稳定、货品可标准化后开号——先定货，再开播，**不先建直播间**。

满足条件
再上

二期 – 农产品初加工

可持续 5 分、四条中最强，国家支持周期排到 2030 年；但“先建后补”需全额垫资，村集体垫不起。

触发 ① 一期产量稳定且达最小规模（冷库下限 100 m^3 有料可装） ② 补贴与垫资方案落实 ③ 有明确销路或订单。**三条不齐即不启动**，防止重蹈“建成即空转”。

现在不押

暂缓 – 乡村民宿

加权 2.15 分、四条中最低；全国平均入住率 36%，64.55% 的民宿不足 40%。本村无景区依托、不在旅游线上，大理 1:6 的带动倍数不适用。


重估触发 本村出现稳定外部客流（区域道路改造完成、周边景区建成）后重新评估。

18 个月：从一块地到一条链

三个阶段，五个可检查的节点

18 个月　**120** 亩连片

关键依赖：阶段一能否按期完成，取决于镇里用地手续的办理时间（见 P20 请求二）。

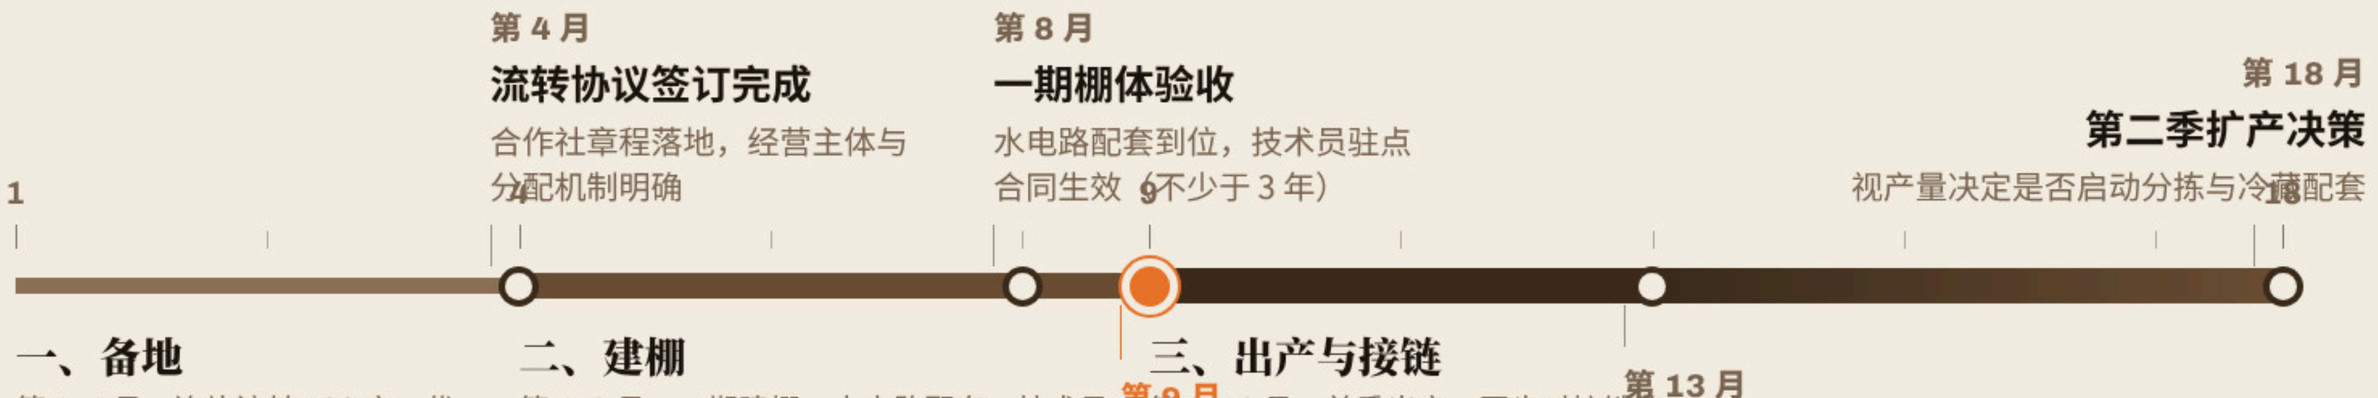

压缩「周期」　阶段二结束即进入现金流窗口　　**兑现「带动户数」**　阶段一的流转农户即首批受益户

本页所列为计划节点，非已完成事项；实施进度以工作队台账与镇里批复为准。

需要镇里支持的三件事

钱、地、路，按轻重排序

01 钱 | 一期启动资金缺口

最难办，也最要紧

请求镇里协调一期启动资金，并明确资金到位时间。

> **关键条件：资金须在第 1 月内明确渠道，否则整条 18 个月路径顺延。**

300–500 万元

量级测算，具体以招标结算为准

一期 120 亩设施果蔬，以冷棚为主并配套水电路。按辽宁喀左 2023 年补贴方案成本参数：冷棚约 2.0 万元/亩、日光温室改造约 6.85 万元/亩（行业参考区间，非本地报价）。可争取补贴按连片 50 亩以上档位测算（冷棚 0.6 万元/亩、日光温室 2.5 万元/亩）。

村集体 2023 年经营性收入 4.8 万元，无自筹能力（见 P6）。

02 地 | 设施农业用地手续

卡在第一阶段

请求协调设施农业用地备案手续，明确办理路径与预计时限。

> **关键条件：直接决定阶段一能否在第 4 月前完成。**

涉及连片流转约 120 亩。

03 路 | 销路对接

最容易办

请求协助对接镇域内及县城稳定采购渠道：学校、机关食堂、商超、批发市场。

> **关键条件：销路决定“风险”维度的实际暴露程度。**

这一项不需要资金，只需要一次对接。

我们最怕的三件事，以及怎么接住

风险不是不说，是提前写好应对

风险	触发信号	对冲动作
01 **技术员又走了** 来自 2022 香菇棚：技术员离村停摆，菌棒成活率跌至四成	技术员提出离职意向， 或单季成活率、合格率 低于约定阈值	① 技术服务合同锁定不少于 3 年，并设违约条款 ② 同步培养 2 名本村技术骨干，签订培养协议 ③ 与县农技推广站建立备用对接
02 **价格跌下来** 来自 2023 黑猪合作社：遇价格低位，社员退股	批发价连续两旬 低于保本线	① 优先签订保底收购协议（即请镇里对接的销路） ② 错季排产，避开集中上市 ③ 控制一期规模，不一次把摊子铺满
03 **建起来没人种** 来自本村人口现实：常住 412 人，平均 61 岁	用工报名人数 低于岗位需求	① 优先采用轻体力、可拆分的岗位设计 ② 以日结用工＋土地租金双重联结，降低参与门槛 ③ 与邻村建立劳务协作

以上为风险预案，非已发生事件；预案不保证风险不会发生。

已经发生的事：到今天为止

以下为已完成事项，可核查

全村耕地逐块摸排

已完成登记造册：**2 140** 亩、**1 832** 块地块全部入册，含 **420** 亩撂荒地台账

入户走访

386 户 全覆盖，已走访完毕，劳动力与流转意愿登记完成

流转意愿摸底

已签订流转**意向**的农户 **147 户** （意向），涉及耕地 **326 亩**；尚未转为正式流转协议

四条路线实地考察

已走访县域内 **4** 个对标点位，形成五维度评估依据

技术对接

与县农技推广站完成**初步对接**，对方确认可提供驻点技术指导；尚未签订技术服务合同

村两委决议

村两委会议已通过《产业路线评估与优先序建议》



下一个 90 天

四个可检查的节点，下次汇报逐条对账



30 天

1 **资金渠道明确** 需镇里协调 · 请求一

一期资金来源与到位时间书面确认

45 天

2 **用地手续路径明确** 需镇里协调 · 请求二

设施农业用地备案办理路径与时限书面答复

60 天

3 **流转意向转正式协议** 工作队 + 村两委

不少于 120 亩**连片**地块的正式流转协议（目标值）

90 天

4 **技术服务合同签订** 工作队 + 县农技站

不少于 3 年期的驻点技术服务合同

— 前两件要靠镇里，是本页提出的依赖项

— 后两件由工作队自行交账

节点间距按真实天数分布：0–30 松，30–45–60 紧，60–90 再放开。

以下为计划节点，非已完成事项。



把一亩地变成一份工资条

现在　玉米自种

约1000元/年

一年一次、看天

→

一期跑通后　流转＋务工

约1.6万元/年

按月结算、可预期

这不是让谁富起来，是让一个六十一岁的人，在自己村里，每个月有一份说得清的收入。

以一户 5.5 亩计的测算值，非承诺的收益保证：租金按 500–600 元/亩·年、日工资按 110 元/天×120 天测算，实际以流转协议与用工合同为准。



柳溪村驻村工作队

汇报人：驻村第一书记 / 工作队队长

2024 年 · 柳溪村
